Gesamtterminplan - Erneuerung WB

Version: 1.4 Stand: 30.10.2019 Bearbeitet: rv, RR, TTh

RAPP

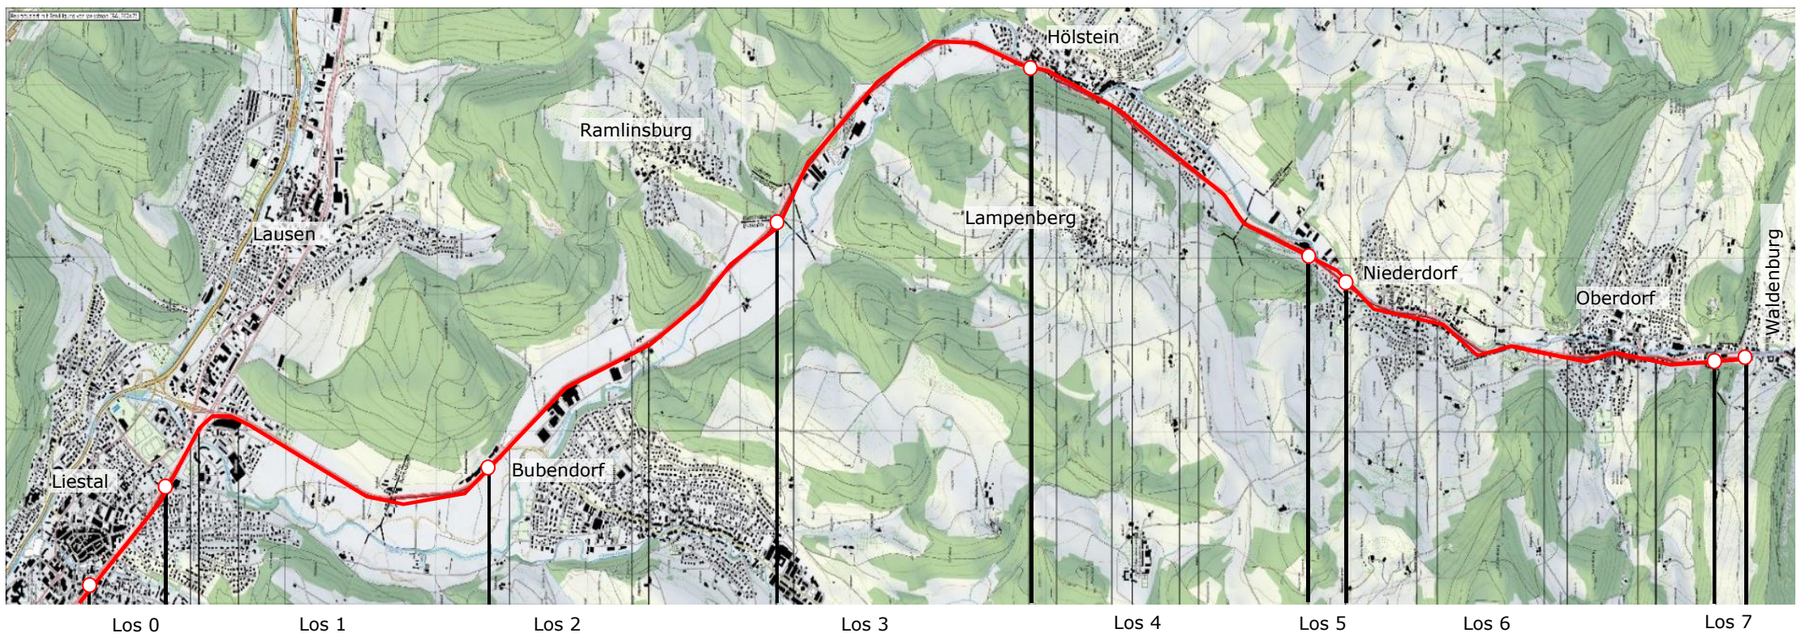

Bauarbeiten Erneuerung WB

WB-Projekte	Bauzeit von	Bauzeit bis	Dauer	Ereignis / Arbeit
			Quartal	2019 Q2 Apr–Jun; Q3 Jul–Sep; Q4 Okt–Dez; 2020 Q1 Jan–Mär; Q2 Apr–Jun; Q3 Jul–Sep; Q4 Okt–Dez; 2021 Q1 Jan–Mär; Q2 Apr–Jun; Q3 Jul–Sep; Q4 Okt–Dez; 2022 Q1 Jan–Mär; Q2 Apr–Jun; Q3 Jul–Sep; Q4 Okt–Dez; 2023 Q1 Jan–Mär; Q2 Apr–Jun; Q3 Jul–Sep
			Monate	Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep
	30.04.19			Erhalt PGV Los 0 (SBB)
Los 0	01.04.19	31.05.19	2.0	Vertrag, Admin, AVOR
	24.06.19	03.04.21	21.3	Hauptarbeiten unter Betrieb
	04.04.21	30.06.22	14.9	Hauptarbeiten in Sperre inkl. Fahrleitung; Übergabe Trassee
	01.07.22	30.09.22	3.0	Sicherungsanlagen
	01.10.22	30.11.22	2.0	Testbetrieb
	01.01.23	28.02.23	1.9	Nacharbeiten unter Betrieb
	22.05.20			Erhalt PGV Los 1
Los 1 03.07.	01.05.20	30.06.20	2.0	Vertrag, Admin, AVOR
	01.07.20	09.03.21	8.3	Hauptarbeiten unter Betrieb
	01.04.21	26.01.22	9.9	Hauptarbeiten in Sperre
	15.07.21	26.01.22	6.4	Gleisbau; Übergabe Trassee
	27.01.22	31.03.22	2.1	Fahrleitung
	01.04.22	30.06.22	3.0	Sicherungsanlagen
	01.07.22	30.11.22	5.0	Testbetrieb
	22.05.20			Erhalt PGV Los 2
Los 2 24.10.	23.05.20	22.07.20	2.0	Vertrag, Admin, AVOR
	07.09.20	02.04.21	6.8	Hauptarbeiten unter Betrieb
	05.04.21	08.11.22	19.1	Hauptarbeiten in Sperre
	05.11.21	01.02.22	2.9	Gleisbau; Übergabe Trassee
	09.11.22	31.03.22	-7.3	Fahrleitung
	01.04.22	30.06.22	3.0	Sicherungsanlagen
	01.04.22	30.11.22	8.0	Testbetrieb
	Umleitung Richtung Waldenburg		7.0	
	22.05.20			Erhalt PGV Los 3
Los 3 10.07.	23.05.20	22.07.20	2.0	Vertrag, Admin, AVOR
	23.07.20	03.04.21	8.4	Hauptarbeiten unter Betrieb
	04.04.21	08.07.22	15.1	Hauptarbeiten in Sperre
	15.11.21	07.02.22	2.8	Gleisbau; Übergabe Trassee
	09.07.22	31.03.22	-3.3	Fahrleitung
	01.04.22	30.06.22	3.0	Sicherungsanlagen
	01.07.22	30.11.22	5.0	Testbetrieb
	13.12.22	01.07.23	6.6	Nacharbeiten unter Betrieb
	LSA		7.0	
	Umleitung Richtung Liestal		10.0	
	Umleitung Richtung Waldenburg		9.0	
	17.08.20			Erhalt PGV Los 4
Los 4 21.09.	18.08.20	17.10.20	2.0	Vertrag, Admin, AVOR
	03.08.20	19.03.21	7.5	Hauptarbeiten unter Betrieb
	01.04.21	01.07.22	15.0	Hauptarbeiten in Sperre
	27.05.21	31.03.22	10.1	Gleisbau; Übergabe Trassee
	02.07.22	30.06.22	-0.1	Fahrleitung
	01.07.22	30.09.22	3.0	Sicherungsanlagen
	01.10.22	30.11.22	2.0	Testbetrieb
	02.01.23	19.05.23	4.5	Nacharbeiten unter Betrieb
	LSA		8.0	
	17.08.20			Erhalt PGV Los 5
Los 5 09.07.	18.08.20	17.10.20	2.0	Vertrag, Admin, AVOR
	05.10.20	05.04.21	6.0	Hauptarbeiten unter Betrieb
	06.04.21	07.01.22	9.1	Hauptarbeiten in Sperre
	04.03.22	29.04.22	1.8	Gleisbau; Übergabe Trassee
	08.01.22	30.06.22	5.7	Fahrleitung
	01.07.22	30.09.22	3.0	Sicherungsanlagen
	01.07.22	30.11.22	5.0	Testbetrieb
	LSA		7.0	
	17.08.20			Erhalt PGV Los 6
Los 6 11.07.	18.08.20	17.10.20	2.0	Vertrag, Admin, AVOR
	05.10.20	05.04.21	6.0	Hauptarbeiten unter Betrieb
	06.04.21	28.10.22	18.7	Hauptarbeiten in Sperre
	15.06.21	26.08.22	14.4	Gleisbau; Übergabe Trassee
	29.10.22	30.06.22	-4.0	Fahrleitung
	01.07.22	30.09.22	3.0	Sicherungsanlagen
	01.10.22	30.11.22	2.0	Testbetrieb
	01.01.23	30.09.23	8.9	Nacharbeiten unter Betrieb
	VD		9.0	
	LSA 1 (Kanalisation)		7.0	
	LSA 2 (Bohrarbeiten)		11.0	
	LSA 3 (Strassenbau)		5.0	
	17.08.20			Erhalt PGV Los 7
Los 7 18.06.	18.08.20	17.10.20	2.0	Vertrag, Admin, AVOR
	18.10.20	03.04.21	5.5	Hauptarbeiten unter Betrieb
	04.04.21	28.10.22	18.8	Hauptarbeiten in Sperre
	04.10.21	24.10.22	12.7	Gleisbau; Übergabe Trassee und Gebäude
	29.10.22	30.06.22	-4.0	Fahrleitung
	01.07.22	30.09.22	3.0	Sicherungsanlagen
	01.10.22	30.11.22	2.0	Testbetrieb
	29.05.23	16.06.23	0.6	Nacharbeiten unter Betrieb
Fahrleitung	01.05.21	30.06.21	2.0	Vertrag, Admin, AVOR
	01.02.22	31.05.22	3.9	
Sicher.-anlagen	01.05.20	30.06.20	2.0	Vertrag, Admin, AVOR
	01.04.22	30.09.22	6.0	

Vergabe Baumeister

Abgabe Ausschreibungsunterlagen

Start Submission

Eingabe Offerten Baumeister

Vergabe Baumeister

Totalsperrung

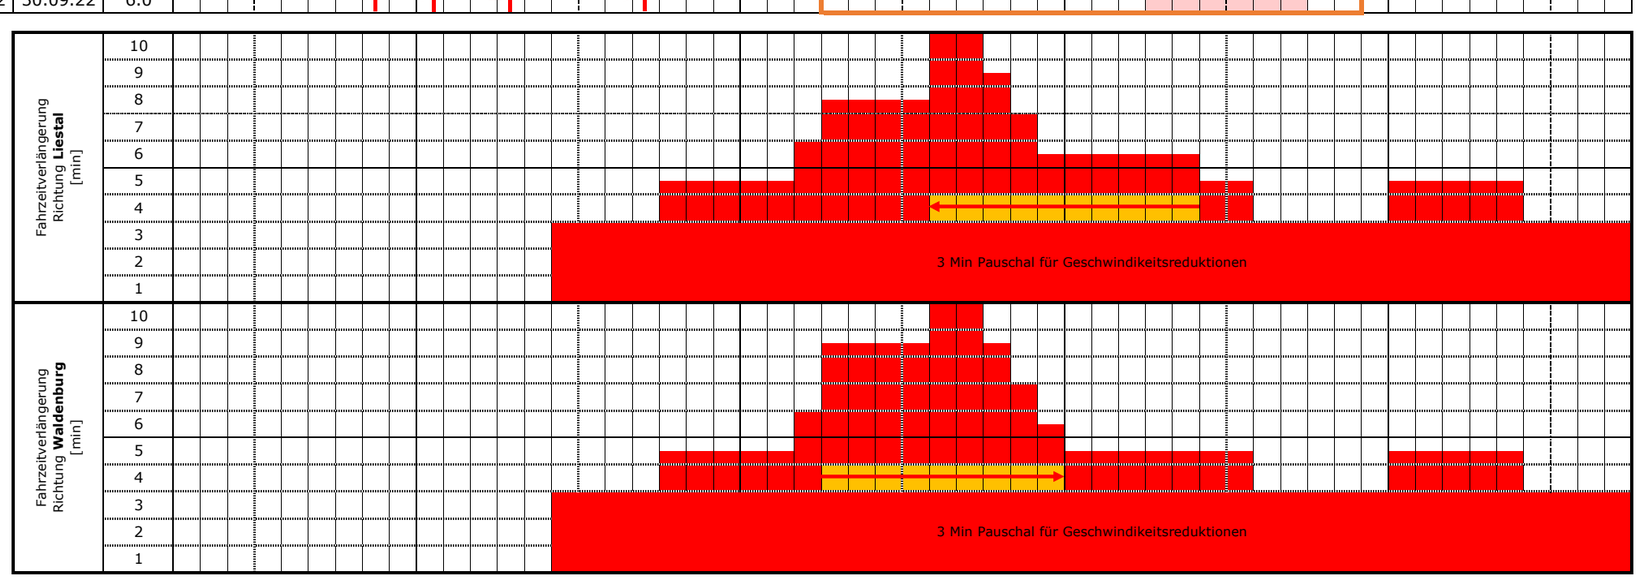

Legende Strassensperren:

- LSA
- Umleitung Richtung Waldenburg
- Umleitung Richtung Liestal
- Umleitung irrelevant für FZB
- Verkehrsdienst
